


Mode opératoire : Nettoyage GRENAILLEUSE

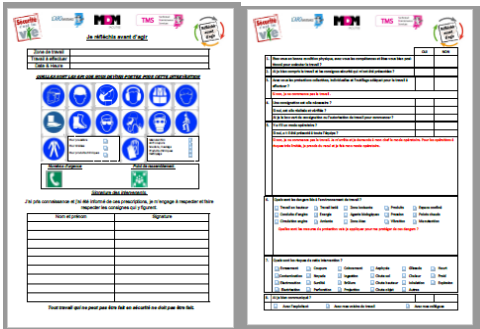

Mode opératoire et analyse de risques

DESCRIPTION DES PHASES DE TRAVAIL	Risques	Moyens et mesures de protection	Responsable
Déplacement de l'atelier Caro vers NLMK Clabecq	Accident de la route, perte de charge.	Contrôler les points importants avant prise en charge (freins, phare, niveau d'huile). Contrôler si la charge est bien arrimée. Position d'un filet sur le plateau, si conduite d'un plateau	Caro
Arrivée sur site NLMK Clabecq	Collision, écrasement.	Ne pas téléphoner au volant, ceinture de sécurité et respect du code de la route. Vigilance lors des déplacements → multiples circulations d'engins, attention priorité au train.	Caro
Prise de connaissance de l'ouverture de chantier et du mode opératoire.	Ne pas avoir pris connaissance des risques de l'intervention.	Compléter correctement « je réfléchis avant d'agir » et contrôle du chef de chantier durant l'exécution. 	Caro

Déplacement à pied de la base de vie vers la grenailleuse



Heurt, glissade, trébuchement, écrasement (chute d'objet) si autres activités




Respect réglementation du site : couloir de circulation, passage pour piétons.
Escalier : se tenir la rampe.
Respect des balisages, signalisation de sécurité.

Attention si pont roulant en activité : respect du cône de sécurité.

Vigilance.

Attention au débord de tôles.

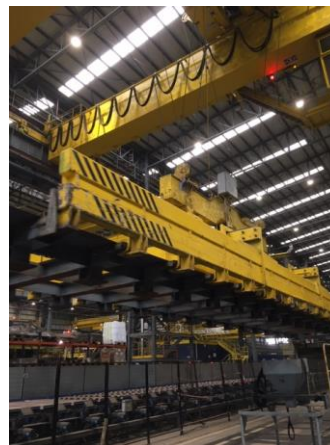

Caro

Réalisation du travail :
Nettoyage du plancher de la grenailleuse :








Circulation sur la zone de travail
→ Trébuchement -
Glissade - ...
Chute de grenaille




Respecter les règles lors de la montée à l'échelle : 3 points d'appuis (2 pieds, une main) ou (2 mains, 1 pied) ne pas se précipiter.
Ne pas se trouver au sous-sol lors du nettoyage du plancher.

Caro



<p>Nettoyage sous la grenailleuse :</p> <p>A l'aide d'une brosse rassembler au pied de la bande transporteuse sous forme de tat la grenaille. Charger celle -ci à la pelle sur la bande transporteuse. Actionner le mécanisme afin de</p>	<p>Bruit → Détérioration de l'audition - Irritabilité - Perte de concentration</p> 	<p>Mise à disposition des EPI auditifs dès 80 dB Port des EPI auditifs si > 85 dB (Affichage pictogramme, utilisation outillages électroportatifs)</p>	<p>Caro</p>
	<p>Circulation sur la zone de travail → Trébuchement - Glissade - ...</p> 	<p>Maintenir constamment ordre et propreté Escaliers : Se tenir à la rampe.</p>	<p>Caro</p> 
<p>Faire d'évacuer la matière dans un Big Bag</p>	<p>Projection et inhalation</p>	<p>Port des lunettes et masque ffp3</p>	<p>Caro</p>
	<p>Utilisation d'outils à main non motorisés (Brosse, pelle ...)</p>	<p>Check visuel outillage, élimination outillage défectueux Pas d'outillage pointu / tranchant en poche</p>	<p>Caro</p>
	<p>Manutention, heurt</p>	<p>Port de charges limité à 25 kg Port de gants de manutention Respect règles d'ergonomie (plier jambes, charge près du corps) Port du casque</p>	<p>Caro</p>




<p>Nettoyage caisson de la grenailleuse : Aspiration des poussières.</p> 	<p>Circulation sur la zone de travail → Trébuchement - Glissade - ...</p> 	<p>Maintenir constamment ordre et propreté Escaliers : Se tenir à la rampe. Mettre en place un plancher (en bois) sur les rouleaux du caisson</p> 	Caro
	Projection et inhalation	Port des lunettes et masque ffp3	Caro
	Risque d'explosion	<p>Vêtement antistatique (salopette et tyvek). Outillage antidéflagrant (si besoin). Pas de GSM dans la zone. Enlever les bijoux (bague, ...) Aspirateur ATEX. Alonge avec transfo isolement. S'assurer de la mise à la terre du caisson.</p>	Caro



Nettoyage et repli chantier	Chute plein pied, escalier, manutention	Vigilance lors des déplacements, tri des déchets, Gant de manutention	Caro
Réception des travaux par Caro et NLMK			Caro - NLMK

Signatures

M O établi le 02/08/19		Par : OUBBA A et HAASE L	
		Nom Prénom	Signature
CARO – MAINTENANCE	Chef de projets :	LEFEBVRE Cyril	
	Chef de chantier :	OUBBA Abdel	
	Conseiller en prévention :	HAASE Laurent	
CLIENT	Responsable pour le chantier :	REMY Jérémy	
	Conseiller en Prévention :	HAUBRUGE Damien	

[illegible]

N.B. Le personnel inscrit sur ce tableau, déclare avoir pris connaissance des risques et des mesures de prévention pour toutes les tâches qu'il aurait à exécuter sur ce chantier et s'engage à les respecter.
